

ELI Beamlines

Zpráva o realizaci projektu pro sněm AV ČR

Vlastimil Růžička, FZU AV ČR, v.v.i.


19. dubna 2012

- Projekt z cestovní mapy European Strategic Forum on Research Infrastructures (ELI zařazeno 2006, dnes 48 infrastruktur)
- První ESFRI projekt do nových členských států EU (CZ, HU, RO)
- Projekt pan-evropského charakteru
- Ambice:
 - první laserová výzkumná infrastruktura s širokým vědeckým záměrem
 - interakce světla s hmotou v dosud nerealizovaném oboru intenzit světla
 - výzkum zaměřený na jevy související s obalem atomu (ELI-ALPS, „attosecond“)
 - výzkum zaměřený na jevy související s jádrem atomu (ELI-NP, „nuclear physics“)
 - První evropské/světové výzkumné laserové centrum zaměřené na uživatelský výzkum

- 2006: ELI zařazeno na cestovní mapu ESFRI
- 10/2007 až 12/2010: ELI-Preparatory Phase (13 evropských států, 40 akademických a vědeckých institucí; financováno EK, DG Research)
- 1.10.2009: usnesení řídicího výboru ELI-PP realizovat ELI jako distribuovanou pan-evropskou infrastrukturu (CZ, HU, RO) s centrálním řízením
- 16.4.2010: podpis MoU **zmocněnci CZ, HU, RO:**
 - Vytvořit přechodnou strukturu ELI-DC: koordinace implementačních prací, příprava budoucího provozu všech 3 centrálně řízených pilířů
 - Připravit založení ELI-ERIC
- 20.4.2011: souhlas EK, DG Regio, s realizací ELI Beamlines v rámci OP VaVpl
- 2.8.2011: rozhodnutí řídicího orgánu, MŠMT, o poskytnutí dotace na realizaci projektu ELI Beamlines (6,8 mld Kč)

- Konsorcium ELI-ERIC:
 - Budoucí právní forma ELI pro provozní fázi
 - Členy budou evropské státy: ČR, HU, RO, ...??
 - Založeno cca 2015
- Rumunsko:
 - Projektová přihláška zaslána EK, DG Regio prosinec 2011
 - Projekt rozdělen do dvou fází (2012-14, 2014-16)
 - Usnesení rumunské vlády (prosinec 2011) zavazuje financovat druhou etapu ze státního rozpočtu, pokud nebudou k dispozici prostředky ze strukturálních fondů
- Maďarsko: plánuje předložit projektovou přihlášku EK v červenci 2012
- **Český pilíř je finančně i realizačně nezávislý na pilířích maďarském a rumunském**

Současný stav přístupových jednání

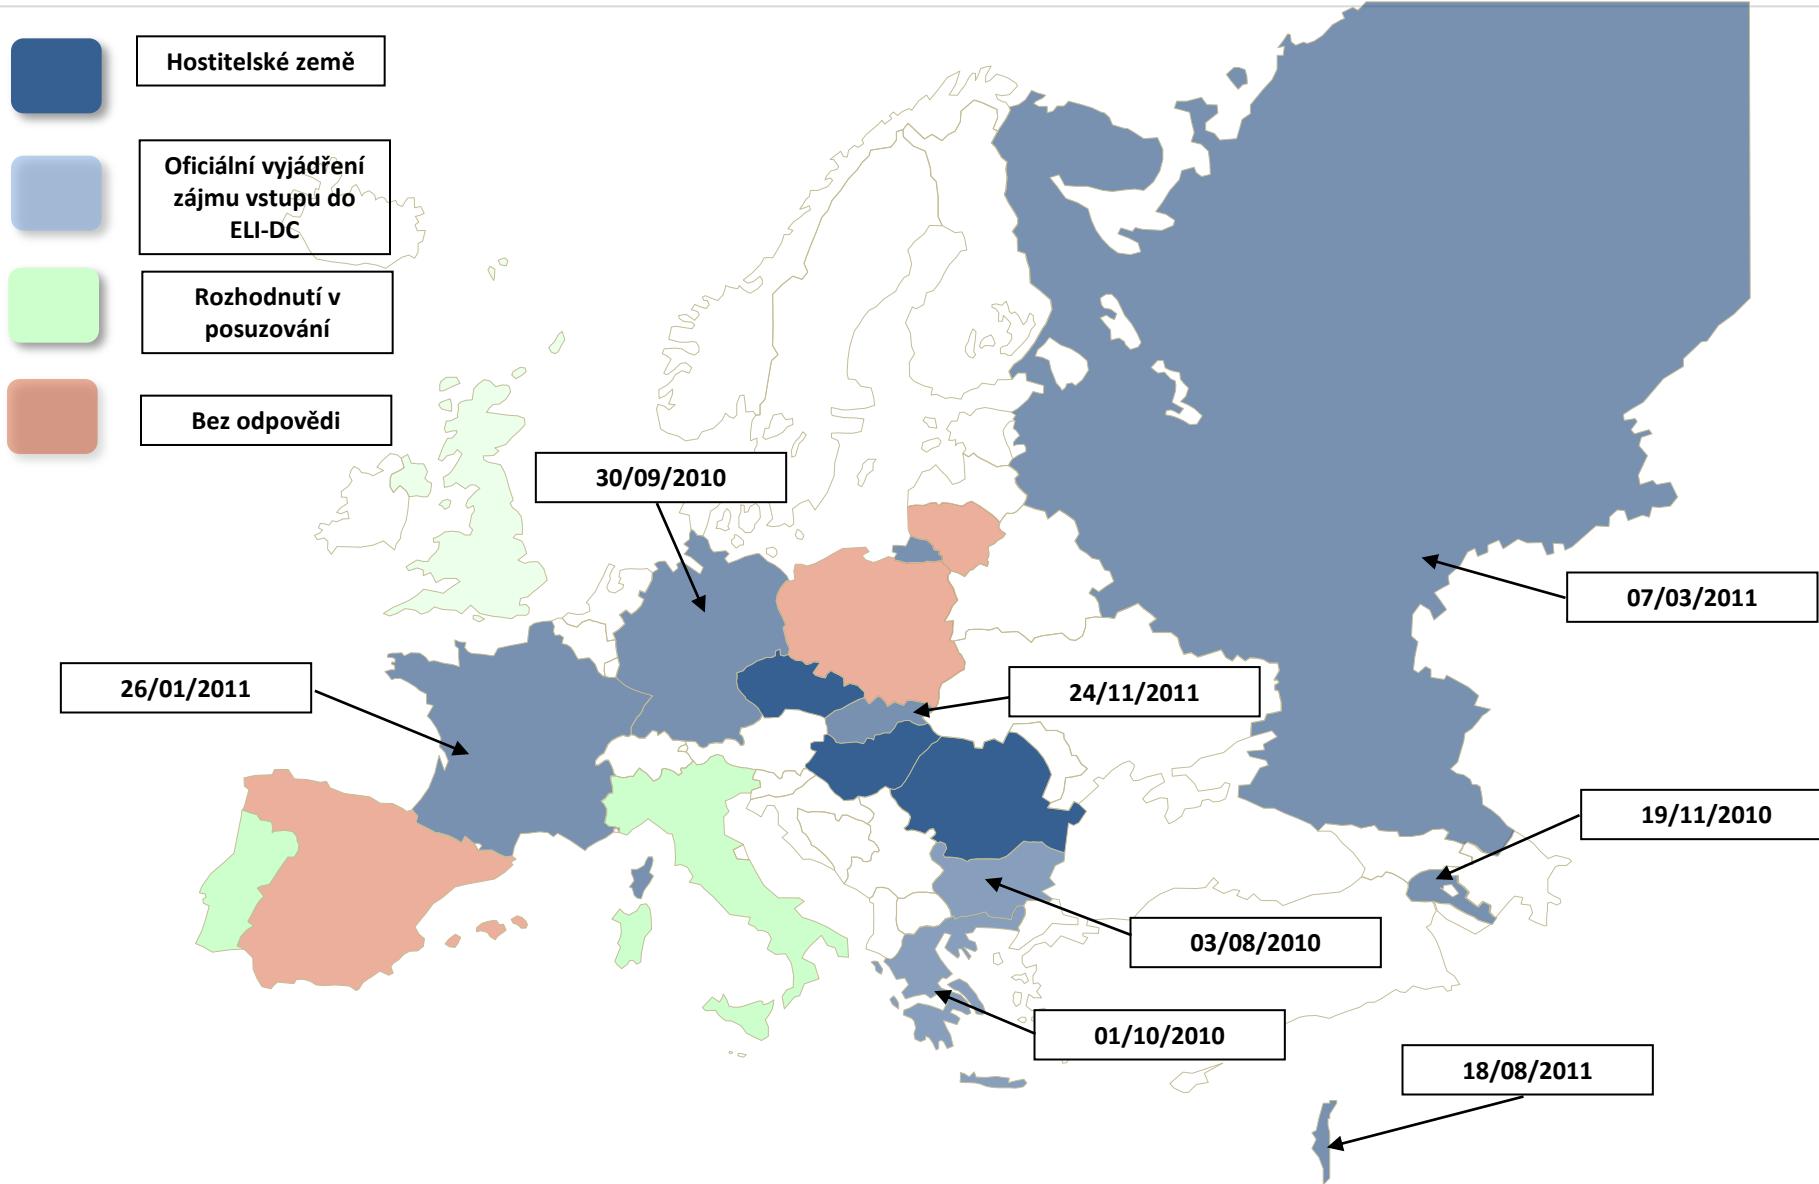

VP 1: Lasery pro generaci repetičních ultrakrátkých pulsů
a mnohonásobně petawattových výkonů


VP 2: Rentgenové zdroje generované ultrakrátkými
laserovými pulsy

VP 3: Urychlování částic pomocí laseru

VP 4: Aplikace v molekulárním, biomedicínském a
materiálovém výzkumu

VP 5: Plasma a fyzika vysokých hustot energie

VP 6: Exotická fyzika a teorie

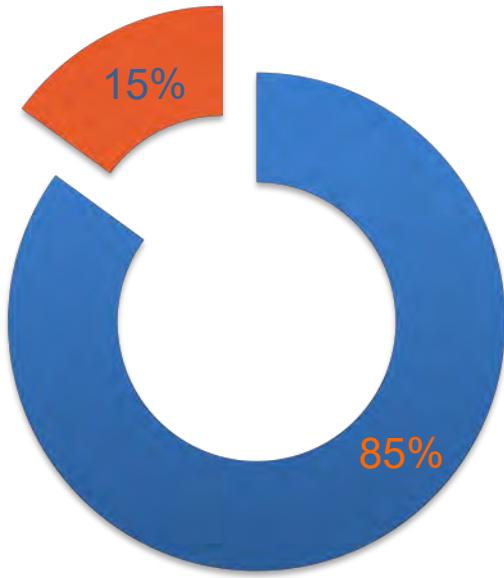

- Strukturální fondy
- Státní rozpočet

Rozpočet realizační fáze	Mld. Kč
Lasery	3,6
Experimenty	0,3
Podpůrné technologie	0,2
Stavba	1,8
Ostatní	0,9
CELKEM	6,8

- Interní

- 103 zaměstnanců FZÚ (březen 2012)
- Zhruba 1/3 vědců, 1/3 techniků, 1/3 řízení a správa projektu

- Externí

- Celkem cca 70 pracovníků
- Řízení
 - Podpora při nastavení procesů: Deloitte
 - Právní podpora: 2 AK; administrace veřejných zakázek
- Stavba
 - Projekt: BFLS Londýn/Praha; řízení stavby, TDI: Gleeds ČR
- Technologie
 - Technické konzultace: experti z UK – Orion projekt

Harmonogram realizace






Budovy:

- laserová hala (3-podlažní, 110x65 m), včetně laboratoří
- multifunkční (administrativní, přednáškové sály, knihovna)


Milníky:

- září 2008 - pravomocné stavební povolení
- listopad 2011 – uzavření kupních smluv na pozemky ELI I
- leden 2012 - zápis pozemkům ELI I do KN
- duben 2012 – zahájení 1. etapy stavebních prací (výkopy)
- září 2012 – zadávací řízení na hlavní etapu stavby
- prosinec 2012 - zahájení hlavní etapy stavby
- březen 2015 – dokončení stavby


Dispozice technologií

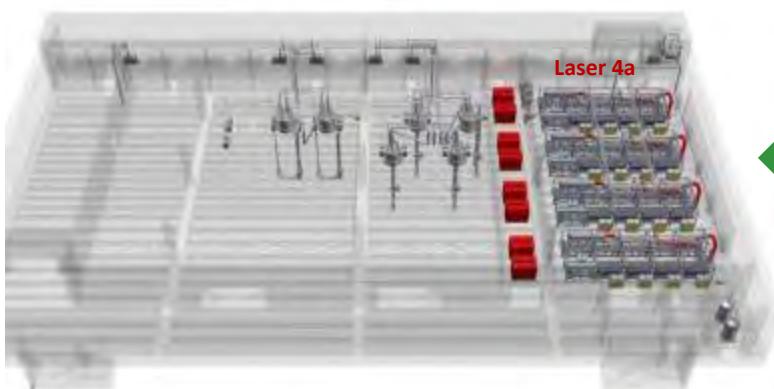

1. patro: Technologické systémy

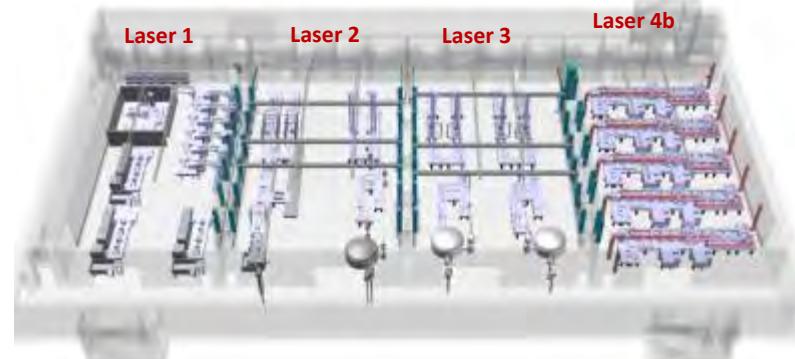

Přízemí: Lasery

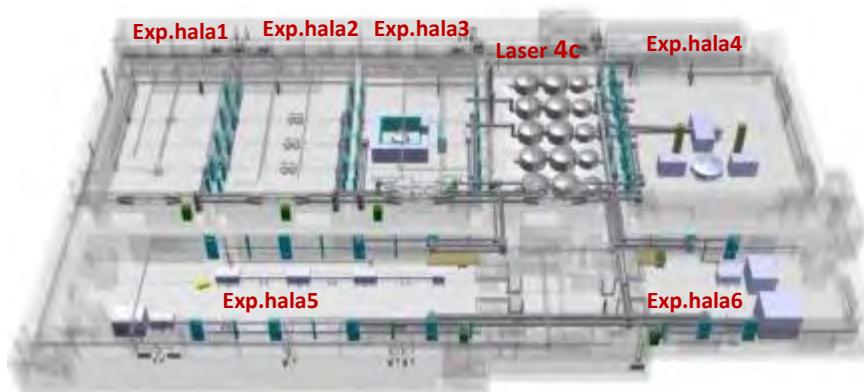

Podzemní patro :
Experimentální prostory,
optické kompresory 10-PW svazků

- Technical Design Report (279 str.):
 - obsahuje v souladu s ELI-PP White Book detailní popis navrhovaného řešení – lasery, experimenty
 - posouzena 6 zahraničními experty, členy ISAC (DE, GB, USA, JP); závěry a doporučení:
 - čas pro realizaci velmi napjatý
 - posílit realizační tým („Project Delivery Manager“)
 - administrativní procedury vnější (ZZVZ, kontrolní, řídicí) neadekvátní pro projekt daného rozsahu a záměru, neodpovídají dobré praxi jiných států
- Vývoj technologií pro laser L1 (200 mJ, 20 fs, 1 kHz) ve FZU
- Vývoj technologií pro lasery L2-L4: evropské/světové laboratoře/vývoj. centra, dodávky výběrovými řízeními
- Výzkumné programy 2 – 6
 - připravují se Memoranda o spolupráci s předními zahraničními institucemi (např. MPQ Garching, STFC Swindon, DESSY Hamburg, LULI Apollon)
 - připravuje se Memorandum o spolupráci s BIOCEV

Výroky o ELI



Ana Arana
Antelo

Zástupkyně vedoucí
kabinetu komisařky pro
výzkum a inovace

„Ráda bych uvedla Českou republiku jako příklad vhodného využívání evropských strukturálních fondů pro implementaci výzkumných infrastruktur. Národní Operační program Výzkum a vývoj pro inovace má v této zemi přiděleno téměř 70% z celkových finančních prostředků na projekty, jakými jsou Evropská centra excelence a regionální VaV centra. Tyto nové výzkumné infrastruktury financované ze zdrojů EU jsou úzce spojeny s projekty uvedenými na cestovní mapě ESFRI. Na té figuruje také ELI, jež bude prvním realizovaným projektem v nových členských zemích EU a bude do něj investováno celkem 700 miliónů EUR pro vědu a výzkum.“



Wolfgang Sandner
koordinátor sítě Laserlab
Europe, ředitel MBI, prezident
Německé fyzikální společnosti



David Cameron
britský premiér

„Těší mě, když vidím, že Rutherford Appleton Laboratory a další britské instituce hrají tak důležitou roli v rámci ELI i v rámci celého sektoru vědy a výzkumu v České republice.“



Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8
eli-cz@fzu.cz
www.elibeamlines.eu

Děkuji za pozornost

Více informací:

<http://www.elibeamlines.eu/>
Vlastimil.Ruzicka@elibeamlines.eu
